10de klankbordgroep bijeenkomst
Windpark Agro Wind Reusel

15 januari 2020

Agenda 15 januari 2020

1. Opening - vaststelling agenda
   - Korte voorstelronde i.v.m. aanwezigheid Sandor Löwik (BMF) en Jan Rots (Bosgroep)
2. Mededelingen/verslag/actiepunten vorige bijeenkomst (3 juli 2019)
3. Voortgang vergunning aanvraag en bijbehorende zaken
4. Thema Natuurcompensatie, natuurversterking en landschap
   - Toelichting op gemaakte afspraken met provincie en gemeente
   - Uitleg visie van initiatiefnemers, door Jacob van de Borne
   - Aanpak invulling van het Inrichtings- en beheerplan, door Jan Rots
   - Eerste idee inrichtingsplan door Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Reusel & Natuur- en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden
5. Rondvraag
6. Plannen volgende bijeenkomst & afsluiting

Stappen in het vergunningproces

- 8 maart 2019 – Indiening vergunningaanvraag & MER
- 9 mei 2019 – Voorlopig advies Commissie m.e.r.
- 16 mei 2019 – Technische vragen commissie gemeenteraad
- 26 augustus 2019 – Informatieavond gemeenteraad
- 19 september 2019 – Besloten raadsvergadering (inbreng wensen en bedenkingen)
- 8 oktober 2019 – Collegebesluit om ontwerp omgevingsvergunning aan raad voor te leggen
- 22 & 28 oktober 2019 – Vergadering Commissie Ruimte + extra vergadering
- 12 november 2019 – Afgeven eerste VVGB gemeenteraad t.b.v. de ontwerpbeschikking
- 14 november 2019 – Ontwerp-besluit Omgevingsvergunning + start zienswijzen indiening
- 9 januari 2020 – Toetsingsadvies Commissie m.e.r.
- 21 januari 2020 – Collegebesluit over raadsvoorstel definitieve VVGB
- 4 februari 2020 – Afgeven tweede vvgb t.b.v. definitieve vergunning (bij zienswijzen)
- 18 februari 2020 – Raadsbesluit over definitieve omgevingsvergunning

=> 17 maart 2020 – Indiening aanvraag SDE+ subsidie (eerste ronde)

Bijbehorende zaken (1)

Naast het proces van vergunningen en bestemmingsplan zijn nog aanvullende afspraken gemaakt met gemeente en provincie:

1. De invulling van “maatschappelijke meerwaarde” zoals uitgewerkt in het Participatieplan met o.a.
    - Inrichting van een Omgevings-/gebiedsfonds
    - Financiële participatie voor omwonenden
    - Gezamenlijke inkoop van de geproduceerde elektriciteit
    - Educatie duurzame energie
2. Instemming om het Windturbinepark voor maximaal 25 jaar te exploiteren
3. Bijdrage aan een substantiële kwaliteitsverbetering van het landschap, gebaseerd op de werkwijze in de provinciale “Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap” (LIR)

Bijbehorende zaken (2)

4. Toevoeging van nieuwe natuur aan het NNB In verband met de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant (NNB)
5. Versterking van de natuur door landbouwgrond om te zetten naar natuur of een aangepaste vorm van extensieve landbouw die bijdraagt aan hydrologisch systeemherstel en biodiversiteit verbetert voor de omliggende natuur
6. Te vertalen naar een 'inrichtings- en uitvoeringsplan' dat gericht is op versterking van natuurwaarden maar ook de recreatieve infrastructuur. Hierbij kan worden gedacht aan een betere toegankelijkheid voor recreanten als voetgangers en fietsers, maar ook ruimte voor natuurversterking voor bijvoorbeeld de gladde slang

Posities windturbines t.o.v. het Natuurnetwerk Brabant

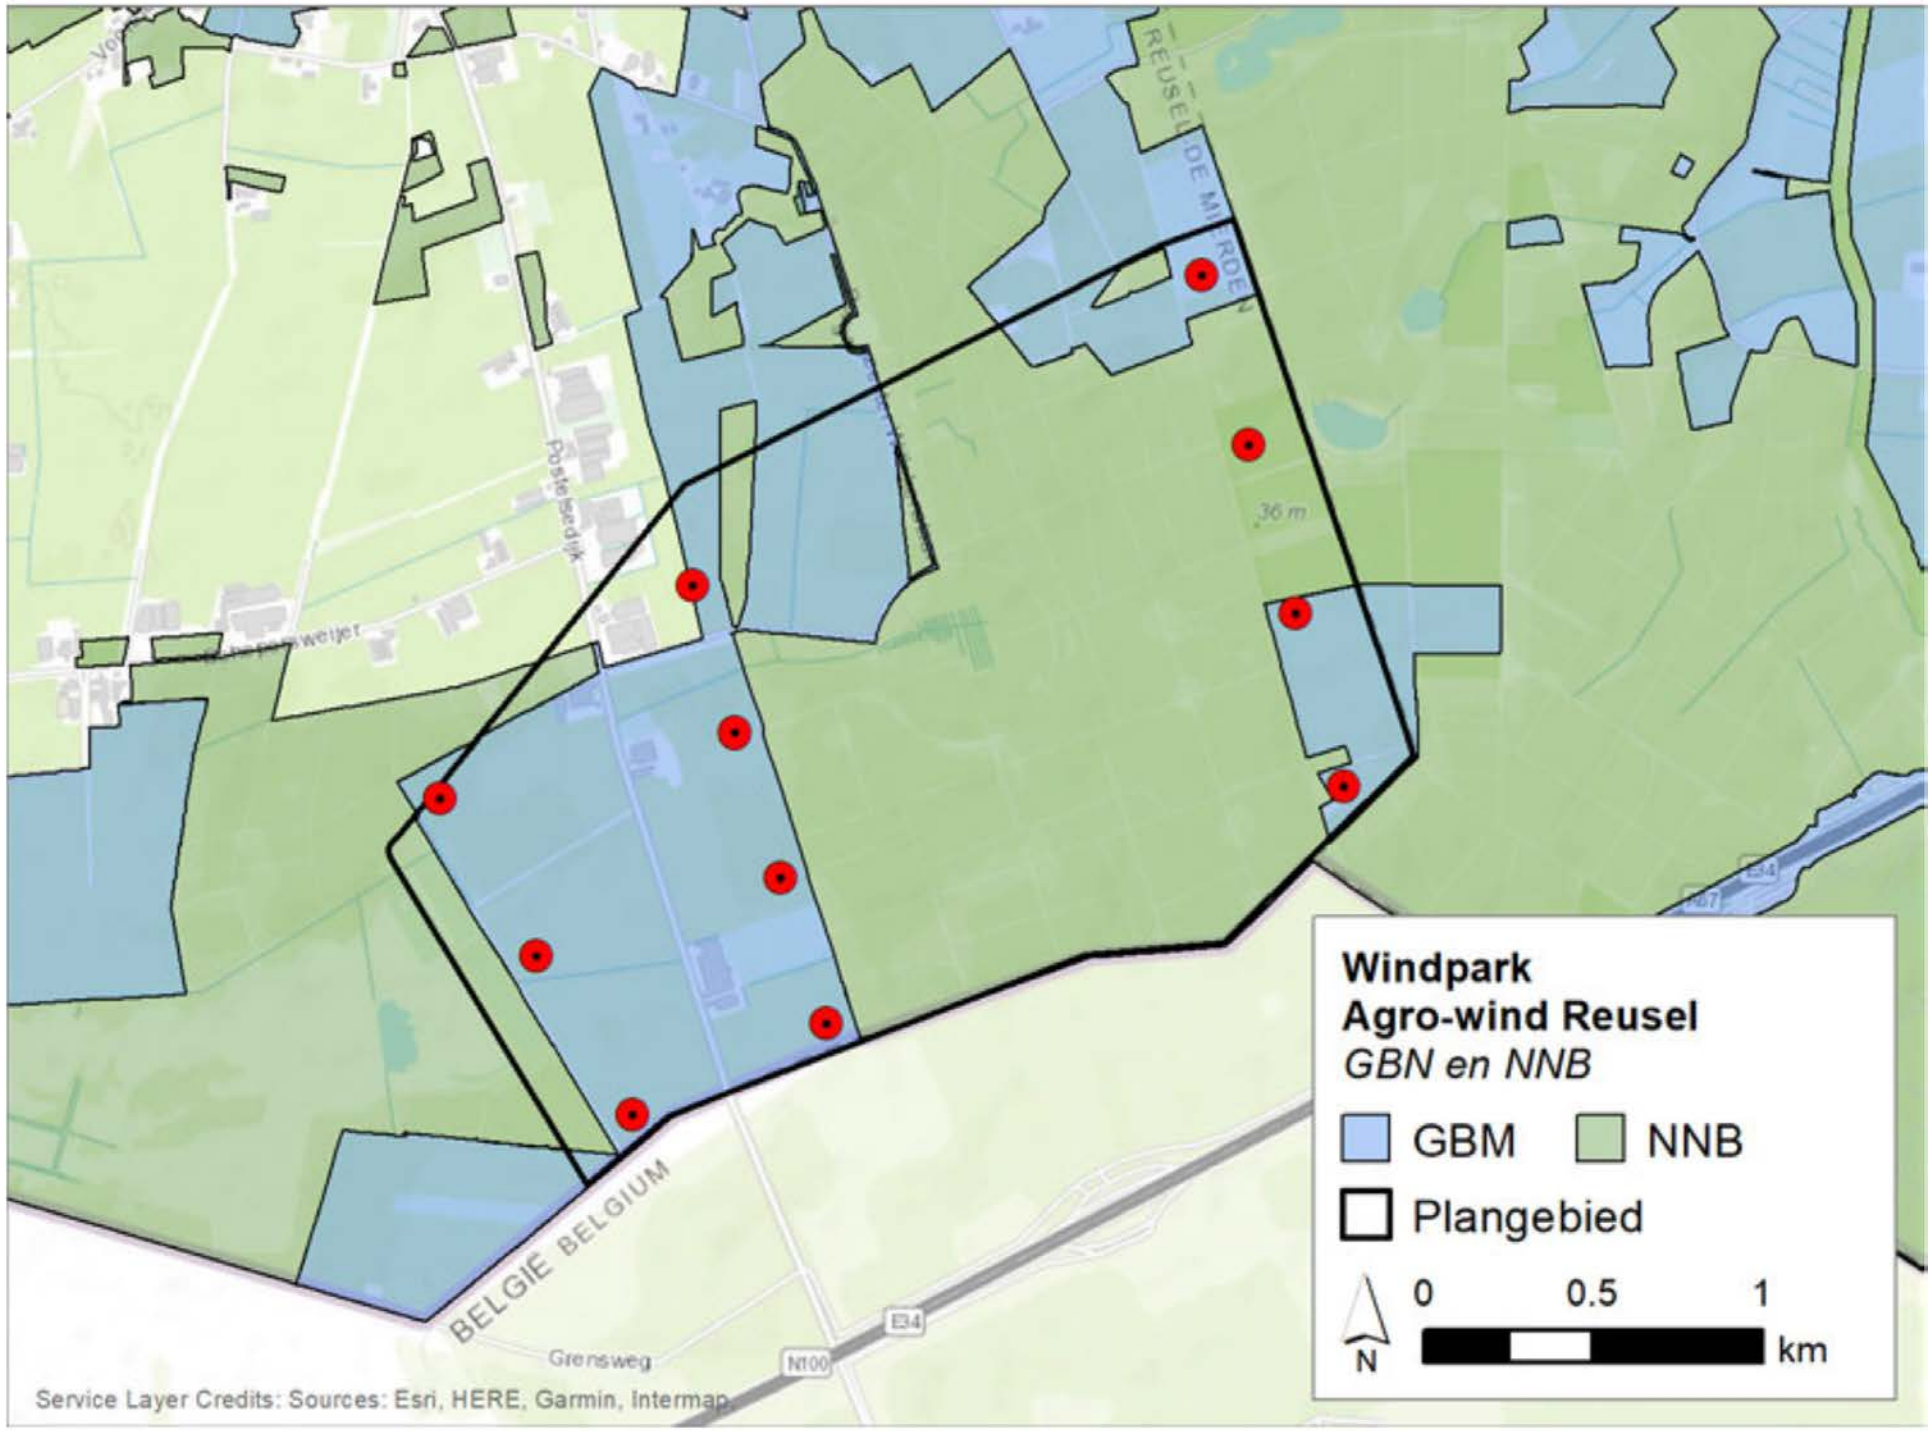

Kaart met directe aantasting en verstoring NNB

Compensatie oppervlak (ha.)

Directe aantasting	1,9932
Indirecte aantasting	4,2799
totaal compensatie	**6,2731**

Gemaakte afspraak met provincie en gemeente:

Inrichtingsplan voor wettelijke compensatie + versterkings-opgave

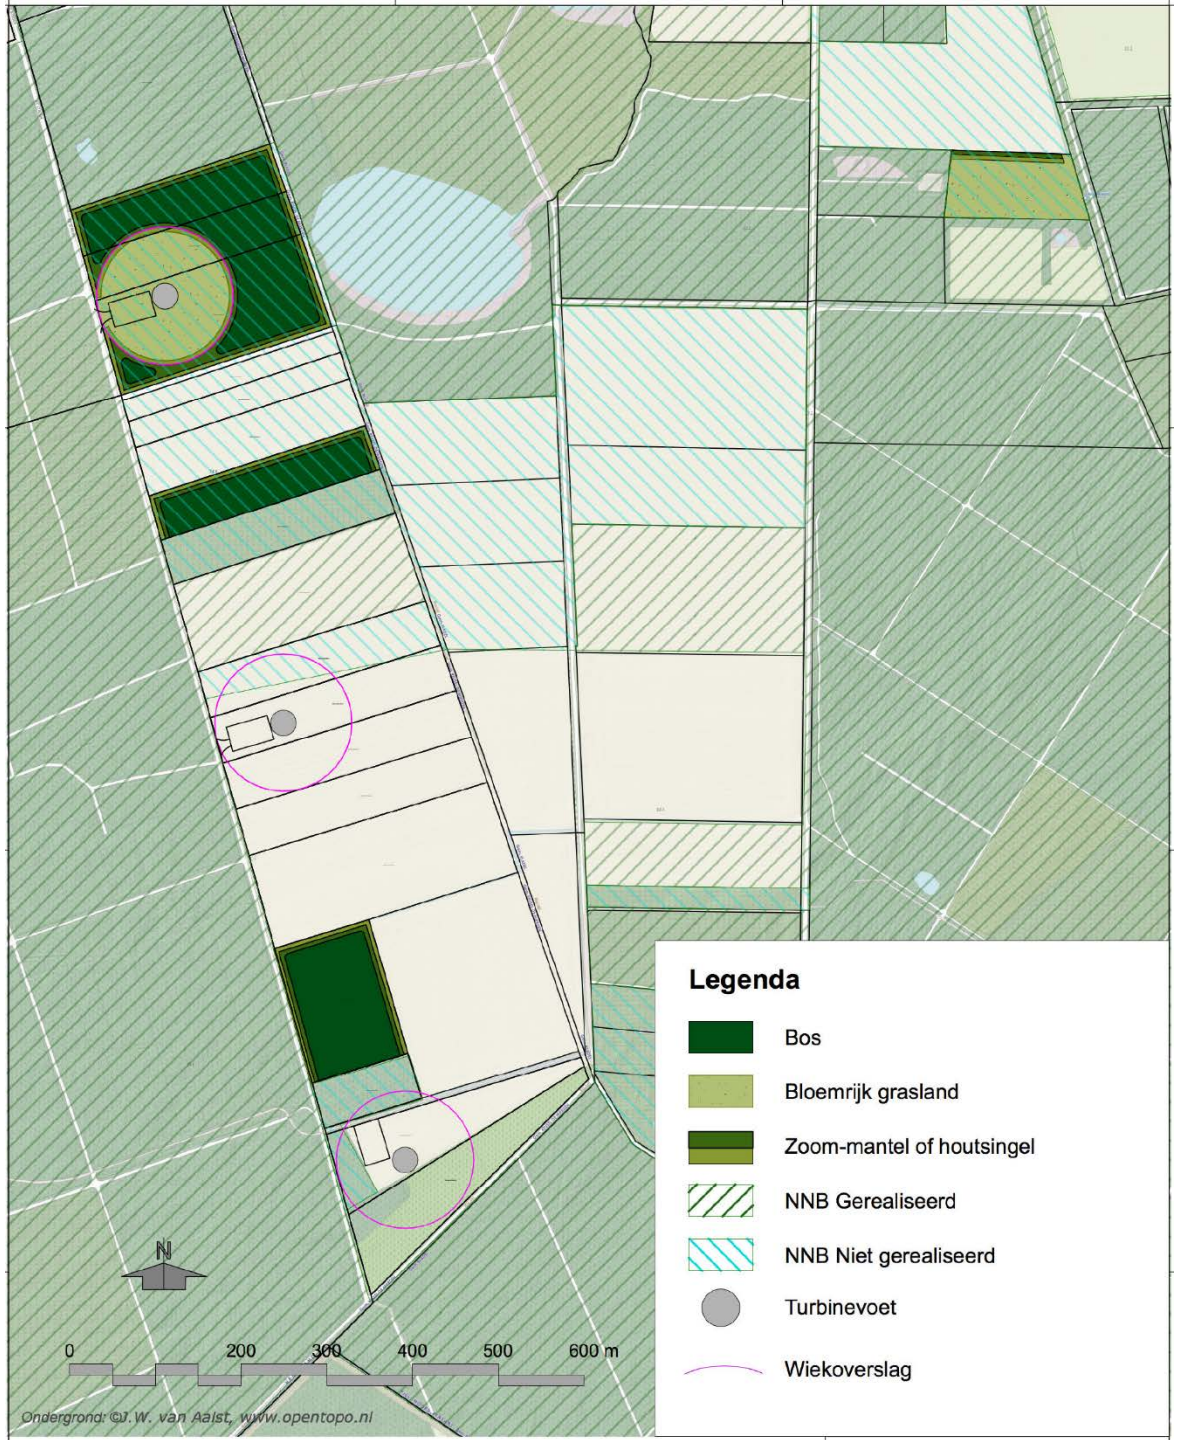

Overzicht totaal beschikbare ruimte voor fysieke compensatie, inclusief extra compensatie en ambitie extensivering

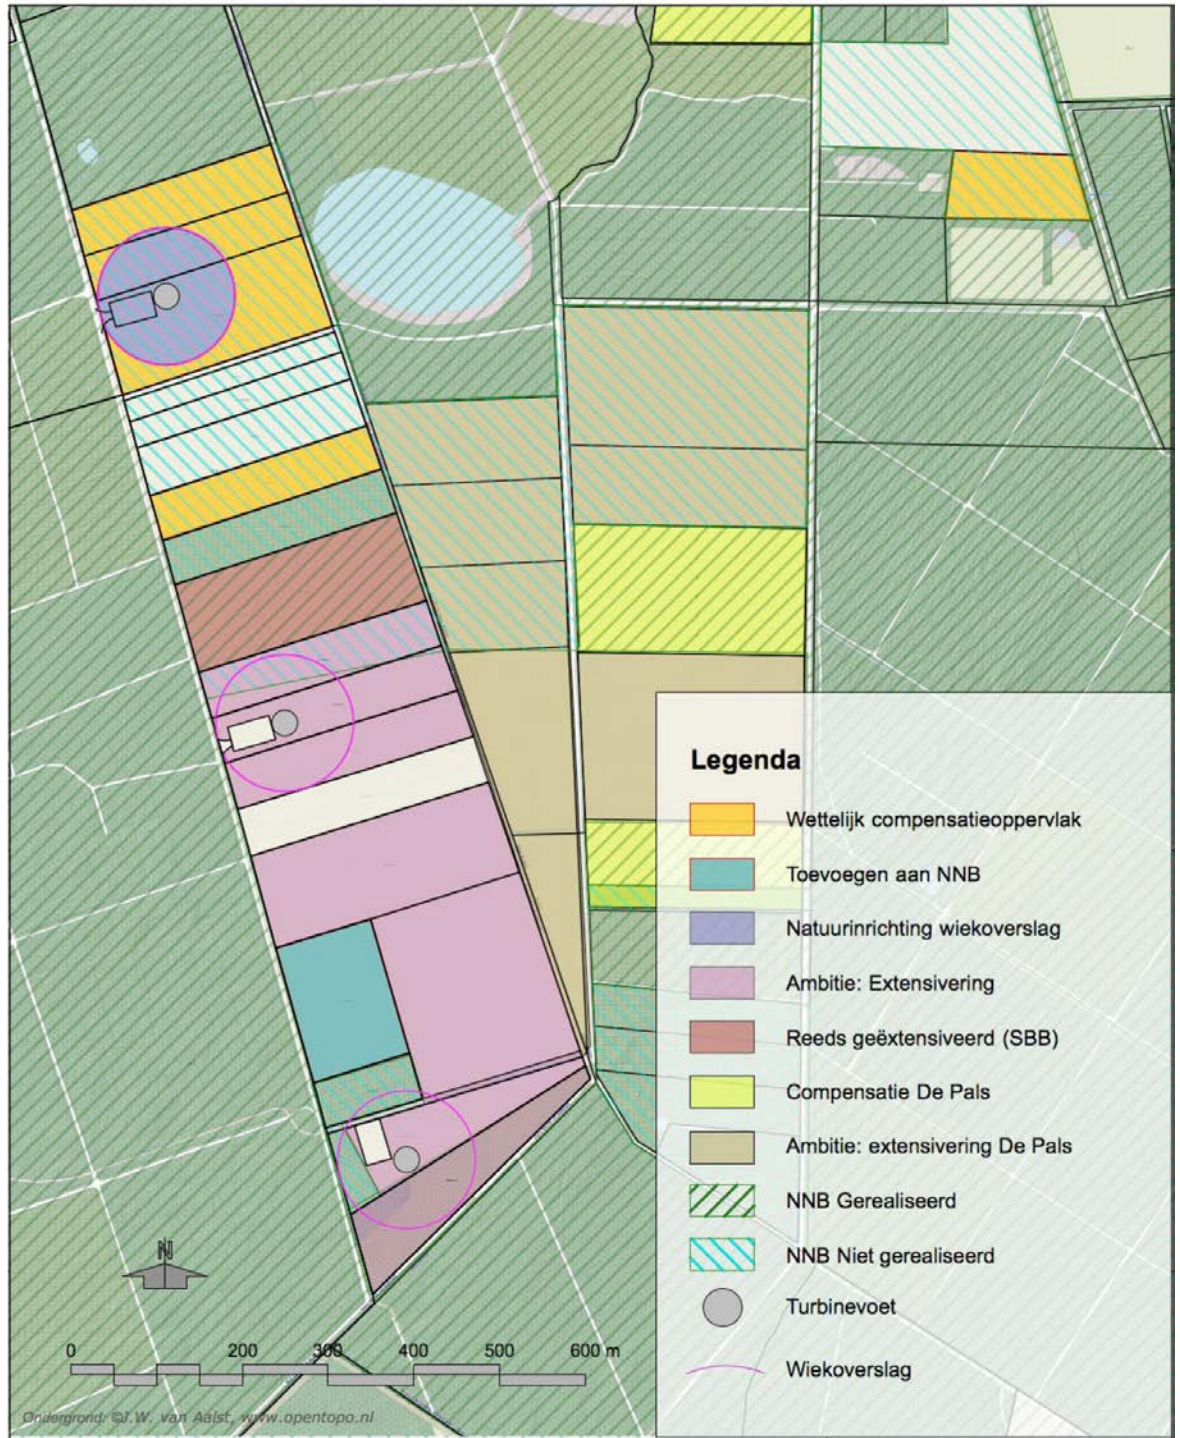

Eerste idee inrichtingsplan Bijenhouders & Natuur- en (Weide)vogel vereniging Reusel-De Mierden

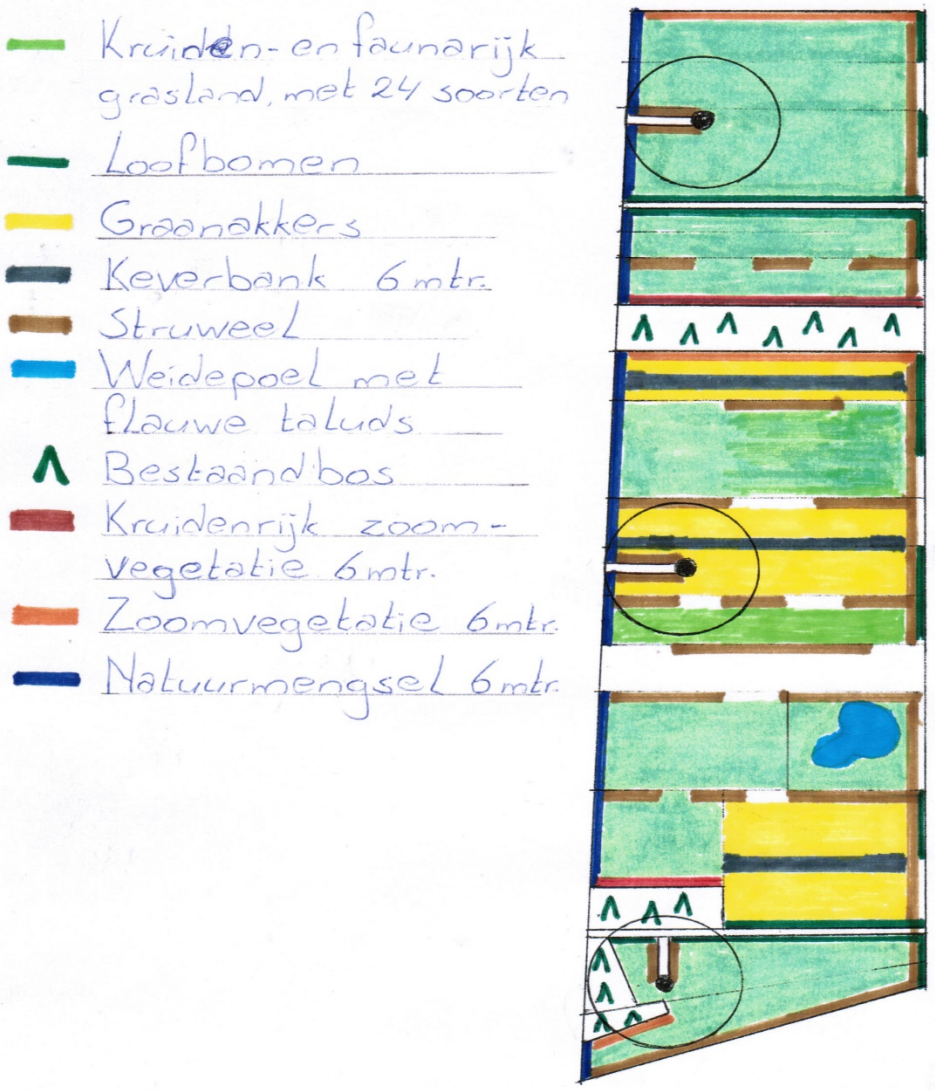

Rondvraag
